
	(B)	Nome	Duração	Início	Fim
1		Projeto: Biblioteca Guaxupé	31 dias?	03/06/24 08:00	15/07/24 17:00
2		Prospecção	4,625 dias	03/06/24 08:00	07/06/24 14:00
3		PTEC	3,3 dias	03/06/24 08:00	06/06/24 10:24
4		Estudar domínio de Aplicação	0,5 dias	03/06/24 08:00	03/06/24 13:00
5	Ö	Reunião com Cliente	0,1 dias	04/06/24 08:00	04/06/24 08:48
6	Ö	Redigir PTEC	1,5 dias	04/06/24 13:00	05/06/24 17:00
7	Ö	Revisão PTEC	0,3 dias	06/06/24 08:00	06/06/24 10:24
8	Ö	Estimativa de Tamanho	0 dias	06/06/24 11:00	06/06/24 11:00
9		Realizar estimativa de Tamanho	0 dias	06/06/24 11:00	06/06/24 11:00
10		Cronograma e Orçamento	0,625 dias	07/06/24 08:00	07/06/24 14:00
11	Ö	Elaborar Cronograma/Orçamento	0,375 dias	07/06/24 08:00	07/06/24 11:00
12	Ö	Revisar Cronograma/Orçamento	0,125 dias	07/06/24 12:00	07/06/24 14:00
13	Ö	Análise	5 dias?	10/06/24 08:00	14/06/24 17:00
14		Documento de Requisitos	3,438 dias?	10/06/24 08:00	13/06/24 11:30
15		Reunião com Cliente	0,5 dias	10/06/24 08:00	10/06/24 13:00
16	Ö	Elaborar DRE	2,875 dias?	10/06/24 13:30	13/06/24 11:30
17	Ö	Revisar DRE	0,6 dias?	12/06/24 08:00	12/06/24 13:48
18	Ö	Aprovação DRE pelo Cliente	1 dia?	12/06/24 11:00	13/06/24 11:00
19	Ö	MRB	2 dias?	13/06/24 08:00	14/06/24 17:00
20		Elaborar MRB	0,5 dias?	13/06/24 08:00	13/06/24 13:00
21	Ö	Revisar MRB	1 dia?	14/06/24 08:00	14/06/24 17:00
22	Ö	Projeto	1,625 dias?	17/06/24 08:00	18/06/24 14:00
23		Diagrama de Classes	1,625 dias?	17/06/24 08:00	18/06/24 14:00
24		Elaborar diagrama de classes	0,875 dias?	17/06/24 08:00	17/06/24 16:00
25		Revisar diagrama de classes	0,375 dias?	18/06/24 08:00	18/06/24 11:00
26		Atualizar MRB	0,25 dias?	18/06/24 11:00	18/06/24 14:00
27	₫ ★!	Planejamento	13 dias?	19/06/24 08:00	05/07/24 17:00
28		Implementação	13 dias?	19/06/24 08:00	05/07/24 17:00
29	★!	Release 01	3,75 dias?	19/06/24 08:00	24/06/24 15:00
30		Implementação RFC02 - Manter livro	1,375 dias?	19/06/24 08:00	20/06/24 11:00
31		Implementar RFS05 - Cadastrar livro	0,5 dias?	19/06/24 08:00	19/06/24 13:00
32	Ö	Implementar RFS06 - Consultar livro	0,4 dias?	19/06/24 08:00	19/06/24 11:12
33	Ö	Implementar RFS07 - Editar livro	0,3 dias?	19/06/24 08:00	19/06/24 10:24
	Ö	Implementar RFS08 - Remover livro	0.0 150	19/06/24 12:00	19/06/24 15:24

Nomes dos Recursos	2 jun 24 9 jun 24 16 jun 24 23 jun 24 30 jun 24 7 jul 24 14 jul 24 S S D S T Q Q Q S S D S T Q Q Q S S D S T Q Q Q S S D S T Q Q Q S S D S T Q Q Q S S D S T Q Q Q S S D S T Q Q Q S S D S T Q Q Q S S
Analista de Requisitos	Analista de Requisitos
Analista de Requisitos[75%];Gerente de Projeto[2	Analista de Requisitos[75%];Gerente de Projeto[25%]
Analista de Requisitos	Analista de Requisitos
Gerente de Projeto[50%];Analista de Requisitos[5	Gerente de Projeto[50%];Analista de Requisitos[50%] ▼ 06/06
Arquiteto de Software[75%];Gerente de Projeto[2	Arquiteto de Software[75%];Gerente de Projeto[25%]
Arquiteto de Software	Arquiteto de Software
Arquiteto de Software;Gerente de Projeto	Arquiteto de Software;Gerente de Projeto
Analista de Requisitos	Analista de Requisitos
Analista de Requisitos[75%];Gerente de Projeto[2	Analista de Requisitos[75%];Gerente de Projeto[25%]
Analista de Requisitos[75%];Gerente de Projeto[2	Analista de Requisitos[75%];Gerente de Projeto[25%]
Gerente de Projeto	Gerente de Projeto
Solome de l'Iojete	Gerenie de Projeto
Arquiteto de Software[50%];Analista de Requisito	Arquiteto de Software[50%];Analista de Requisitos[50%]
Arquiteto de Software	Arquiteto de Software
Arquiteto de Software	Arquiteto de Software
Tester de Qualidade	Tester de Qualidade
Analista de Requisitos	Analista de Requisitos
Gerente de Projeto;Arquiteto de Software	
Arquiteto de Software	
	Biblioteca - Página2

21	ju	124					28	jul	24	1				4 a	go	24		11 ago 24 D S T Q						
S D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q
									р:	hlic	too	2	Dár	nina										
									DI	טווט	iec	a - I	r a(JII Ić	IJ									

	®	Nome	Duração	Início	Fim
5	Ö	Testar RFC02 - Manter livro	0,5 dias?	19/06/24 16:00	20/06/24 11:00
6		Implementação RFC04 - Manter empréstimo	2,75 dias?	20/06/24 08:00	24/06/24 15:00
7	Ö	Implementar RFS13 - Cadastrar empréstimo	1 dia?	20/06/24 08:00	20/06/24 17:00
38	Ö	Implementar RFS14 - Consultar empréstimo	0,5 dias?	21/06/24 08:00	21/06/24 13:00
39		Implementar RFS15 - Editar empréstimo	0,3 dias?	21/06/24 13:00	21/06/24 15:24
40		Implementar RFS16 - Remover empréstimo	0,3 dias?	21/06/24 16:00	24/06/24 09:24
41		Testar RFC04 - Manter empréstimo	0,5 dias?	24/06/24 10:00	24/06/24 15:00
42	∰ ★!	Release 02	4,125 dias?	25/06/24 08:00	01/07/24 09:00
43		Implementação RFC03 - Manter leitor	2,625 dias?	25/06/24 08:00	27/06/24 14:00
14		Implementar RFS09 - Cadastrar leitor	0,6 dias?	25/06/24 08:00	25/06/24 13:48
45	Ö	Implementar RFS10 - Consultar leitor	0,3 dias?	25/06/24 14:00	25/06/24 16:24
46	Ö	Implementar RFS11 - Editar leitor	0,3 dias?	26/06/24 08:00	26/06/24 10:24
47	Ö	Implementar RFS12 - Remover leitor	0,7 dias?	26/06/24 11:00	27/06/24 08:36
48	Ö	Testar RFC03 - Manter leitor	0,5 dias?	27/06/24 09:00	27/06/24 14:00
49		Implementação RFC05 - Manter reserva	2,125 dias?	27/06/24 08:00	01/07/24 09:00
50	o	Implementar RFS17 - Cadastrar reserva	0,5 dias?	27/06/24 08:00	27/06/24 13:00
51	Ö	Implementar RFS18 - Consultar reserva	0,5 dias?	27/06/24 13:00	27/06/24 17:00
52	Ö	Implementar RFS19 - Editar reserva	0,3 dias?	28/06/24 08:00	28/06/24 10:24
53	Ö	Implementar RFS20 - Remover reserva	0,2 dias?	28/06/24 11:00	28/06/24 13:36
54		Testar RFC05 - Manter reserva	0,5 dias?	28/06/24 14:00	01/07/24 09:00
55	∰ ★!	Release 03	5 dias?	01/07/24 08:00	05/07/24 17:00
56		Implementação RFC01 - Manter usuário	2,312 dias?	01/07/24 08:00	03/07/24 10:30
57		Implementar RFS01 - Cadastrar usuário	0,5 dias?	01/07/24 08:00	01/07/24 13:00
58		Implementar RFS02 - Consultar usuário	0,5 dias	01/07/24 13:00	01/07/24 17:00
59		Implementar RFS03 - Editar usuário	0,5 dias	02/07/24 08:00	02/07/24 13:00
60		Implementar RFS04 - Remover usuário	0,3 dias	02/07/24 13:00	02/07/24 15:24
61		Testar RFC01 - Manter usuário	0,5 dias	02/07/24 15:30	03/07/24 10:30
62		Implementação RFC06 - Gerar relatórios	2,625 dias	03/07/24 11:00	05/07/24 17:00
63		Implementar RFS20 - Gerar relatório de empréstimos	0,3 dias	03/07/24 11:00	03/07/24 14:24
64		Implementar RFS21 - Gerar relatório de leitores cadastrados	0,7 dias	03/07/24 15:00	04/07/24 11:36
65		Implementar RFS22 - Gerar relatório de livros cadastrados	0,4 dias	04/07/24 12:00	04/07/24 16:12
66	O	Implementar RFS23 - Gerar relatório de livros no sistema	0,6 dias	05/07/24 08:00	05/07/24 13:48
67		Testar RFC06 - Gerar relatórios	0,375 dias	05/07/24 14:00	05/07/24 17:00
٠.	∰ ★!	Monitoramento e Controle		03/06/24 08:00	15/07/24 17:00

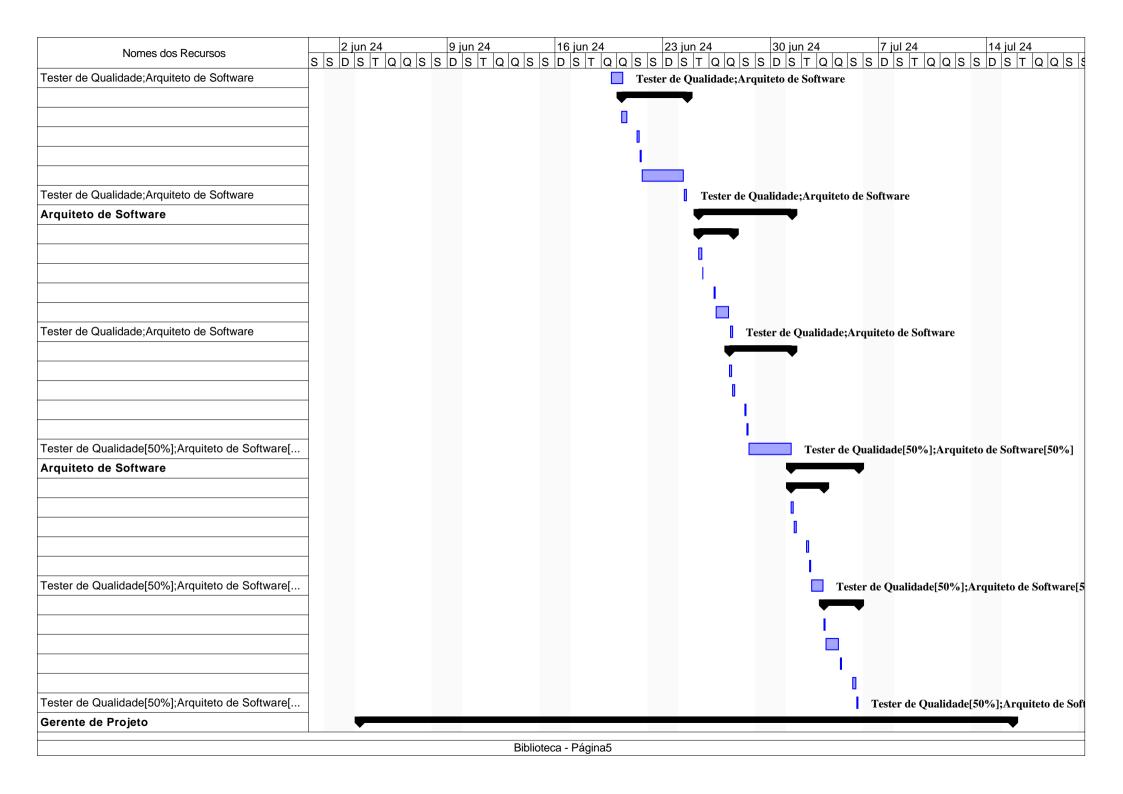

Γ	21 jul 24								:1	24	ı				4 ago 24								11 ago 24				
-	21	jui S	24 T	_	_	S	S	28 D	jul S	74 T		Q	0	0	4 a	igo S	74 T		Q	c	S	11 D			+		
5	D	5		Q	Ų	5	5	טן	5		ΙQ	JQ	5	5	ט	5		Ų	Ų	5	5	טן	S	ΓQ	_		
0] %]																										
U	70]																										
ĺ																											
,	ware	[50	%]																								
E																									_		
										Bil	blio	tec	a -	Ρáς	gina	16											
_																									_		

	Ø	Nome	Duração	Início	Fim
69		Acompanhar Projeto	31 dias	03/06/24 08:00	15/07/24 17:00
70	Ö	Fase de Fechamento	4 dias?	05/07/24 08:00	10/07/24 17:00
71	Ö	Processo de Controle de Mudanças	4 dias?	10/07/24 08:00	15/07/24 17:00

Nomes dos Recursos	2	2 jun 24	9 jun 24	4	16 jun 24	23 jun 24 Q S S D S T	4 ;	30 jun 24	7 jul 24	14 ju	24
Gerente de Projeto	S S E) S T Q Q	S S D S T		D S T Q	Q S S D S T	Q Q S S I	D S T Q Q	! S S D S T	Q Q S S D S	TQQS
	+										Gerente de I
Arquiteto de Software[25%];Gerente de Projeto[2	+									Arquiteto de S	Software[25%]
Arquiteto de Software[50%];Tester de Qualidade[Arquiteto de
				Ribliotos	a - Página8						
				סטווטופט	a - rayınab						

21 ju	ıl 24	1				28	jul	24					4 a	igo	24					11	ag	0 2	4
D S		Q	Q	S	S					Q	S	S					Q	S	S			Т	Q
Projeto																							
;Geren	te d	e Pr	oje	to[2	25%	6];	Ana	list	a d	e R	equ	ıisi	tos[25%	%];	Te	ster	de	Qι	ıalio	dad	e[2	5%
Softw	are[50%	[;[c	est	er	de (Qua	lida	ade	[50	%]												
								Bib	oliot	teca	a - l	Ρáς	gina	9									
